



PREFECTURE  
DE LA NIÈVRE



Conservatoire  
d'espaces naturels  
Bourgogne



## Animation des Sites Natura 2000 « Val de Loire Nivernais »

*Rapport d'activité : Avril 2020 – Juin 2021*

Financements :




<b>Organisme</b>	Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne
<b>Rédaction</b>	Thibaud WYON
<b>Date de publication</b>	Décembre 2021
<b>Financement de l'étude</b>	Animation du site Natura 2000 : FEADER, État
<b>Localisation</b>	Sites Natura 2000 « Val de Loire Nivernais » FR2600966 et FR2612010
<b>Objectif du rapport</b>	Le présent document s'inscrit dans la mise en œuvre des documents d'objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000 « Val de Loire Nivernais ». Il rapporte l'animation Natura 2000 mise en place sur la période 2020/2021 par la structure animatrice, le CEN Bourgogne, sous l'autorité du maître d'ouvrage, à savoir l'Etat.
<b>Mots-clefs</b>	Animation Natura 2000, Rapport d'activité, Loire, MAEC
<b>Illustrations</b>	CEN Bourgogne 2021

## Table des matières

1. Bilan temporel de l'année 2020-2021 .....	4
2. Information, communication et sensibilisation .....	5
3. Veille, conseil, appui technique.....	6
4. Articulation avec les politiques publiques .....	7
5. Mise en œuvre et suivi des mesures de gestion .....	8
5.1. Réflexion et mise en œuvre d'autres actions de gestion.....	8
5.2. Mesures agro-environnementales et climatiques .....	9
5.3. Contrats et Chartes Natura 2000 .....	10
6. Évaluation et amélioration du dispositif.....	11
7. Gestion administrative et financière .....	12

## 1. Bilan temporel de l'année 2020-2021

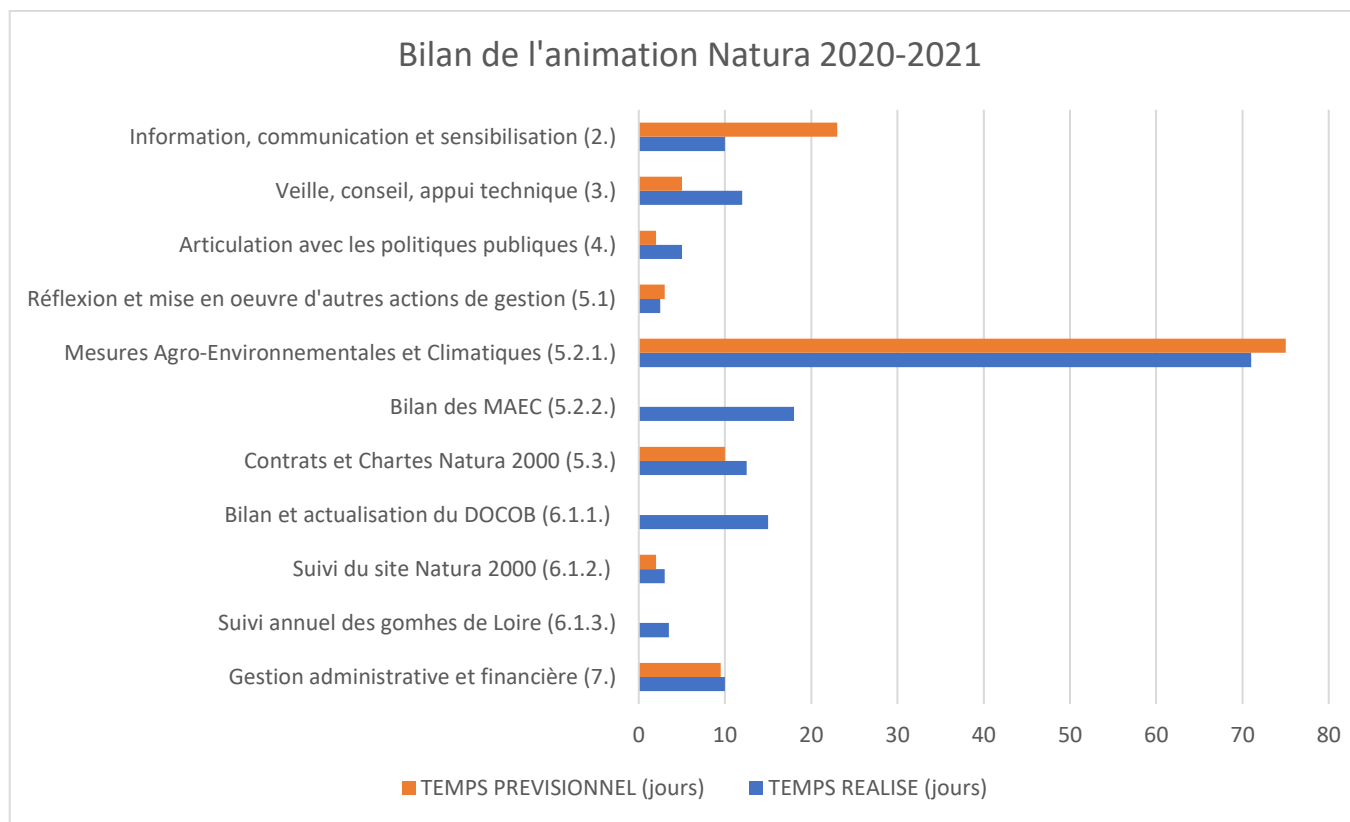

L'augmentation des temps réalisés (162.5 jours) par rapport aux temps prévisionnels (120 jours) est liée aux avenants suivants :

- Report du bilan des MAEC de la 2<sup>nd</sup> tranche à la 3<sup>ème</sup> tranche d'animation, 3<sup>ème</sup> trimestre 2020 (+ 18 jours)
- Prolongation de la 3<sup>ème</sup> tranche d'animation jusque fin juin 2021 (+ 24.5 jours)

La différence de répartition du temps entre prévisionnel et réalisé est exposé dans les paragraphes suivants.

## 2. Information, communication et sensibilisation

Action prévue	Description	Jours prévus	Jours réalisés	Indicateurs de résultats	Suites à donner
Gazette Natura 2000	Rédaction des articles suivants en 2021 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modification du périmètre du site Natura</li> <li>- Bilan des MAEC et perspectives</li> <li>- Actualisation du DOCOB</li> <li>- Zoom sur une espèce exotique envahissante : le raton laveur</li> </ul>	10	5	Publication de 1 plaquette annuelle : <b>0</b>	Mise en forme, impression et diffusion du numéro 6 au 1 <sup>er</sup> semestre 2022. Poursuite de la diffusion des anciens numéros.
Site internet	Aucune action réalisée	5	0	Nombre d'articles mis en ligne : <b>0</b>	Refonte du site internet nécessaire.
Réunion des élus	Animation perturbée par la crise sanitaire. Aucune réunion n'a été programmée.	5.5	0	Nombre de collectivités rencontrées : <b>0</b>	Rencontre des collectivités à la demande en réponse à des projets d'aménagement.
Réunions publiques thématiques	Sortie terrain organisée avec le service déchets de la communauté de communes du Sud Nivernais dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, sur le thème « des dépôts sauvages et de la biodiversité, quels impacts en bord de Loire ? »	1.5	5	Nombre d'acteurs rencontrés : <b>0</b>	Animateur cas contact COVID, sortie annulée. Report de l'action en 2021
Communication régulière auprès de la presse	Article promotionnel dans le JDC pour l'animation nature organisée avec la CCSN dans le cadre de la SEDD.	1	0	Nombre de parutions dans la presse : <b>1</b>	Action à reconduire en 2021

### 3. Veille, conseil, appui technique

Action prévue	Description	Jours prévus	Jours réalisés	Indicateurs de résultats	Suites à donner
Veille générale des projets	<p>Cette action a permis de suivre et d'accompagner 6 maitres d'ouvrages en 2020-2021 sur des projets très variés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 installation en maraichage BIO</li> <li>- 1 opération de faucardage</li> <li>- 1 enfouissement de ligne HT</li> <li>- 2 extensions d'habitation</li> <li>- 1 projet photovoltaïque</li> </ul> <p>Hormis le projet photovoltaïque (sans suite), l'ensemble des opérations a été mené à terme avec des mesures d'évitement ou de réduction des impacts sur le site Natura 2000.</p> <p>On notera que le nombre de jours prévisionnel est largement sous dimensionné, certains projets nécessitent une analyse des études préalables, une visite sur le terrain, des échanges avec les services instructeurs sur la séquence ERC.</p>	3	6.5	<p>Nombre de projets suivis ou réponses aux sollicitations des services instructeurs : <b>6</b></p>	<p>Poursuite de l'accompagnement des porteurs de projets et coordination auprès des services instructeurs.</p> <p>Si la tendance à la hausse du nombre d'appui technique se confirme dans les années à venir, une révision</p>
Appui technique aux administrations		2	5.5		

#### 4. Articulation avec les politiques publiques

Action prévue	Description	Jours prévus	Jours réalisés	Indicateurs de résultats	Suites à donner
Participation aux réunions diverses	<p>L'animation Natura 2000 a été sollicité à plusieurs reprises, notamment par :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La DDT de la Nièvre, pour la gestion du pastoralisme à proximité du captage d'eau potable de Luthenay-Uxeloup ;</li> <li>- La DDT58, pour la régulation du sanglier sur le DPF et le site de Chamon à Luthenay-Uxeloup.</li> </ul> <p>L'animation Natura 2000 a aussi participé à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Club opérateur N2000 du 09/10/2020 ;</li> <li>- CRAEC du 26/11/2020 ;</li> <li>- GT Forêt DREAL du 30/11/2020 ;</li> <li>- GT prairies DREAL du 08/03/2021 ;</li> <li>- Réunion de la DDT de la Nièvre sur le devenir de la digue de Luthenay-Uxeloup (transfère de gestion à la collectivité gémapienne).</li> </ul>	2	5	Nombre de participation à des suivis de projets et de programmes : <b>7</b>	Poursuite du suivi des projets et programmes, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI pour les EPCI du territoire.

## 5. Mise en œuvre et suivi des mesures de gestion

### 5.1. Réflexion et mise en œuvre d'autres actions de gestion

Action prévue	Description	Jours prévus	Jours réalisés	Indicateurs de résultats	Suites à donner
Réflexion et mise en œuvre éventuelle d'autres actions de gestion	<p>Les CEN Allier et Bourgogne sont porteurs d'un projet de contrat territorial (outil agence de l'eau) sur la vallée de la Loire entre Iguerande et le Bec d'Allier. Un travail se poursuit sur la complémentarité des 2 outils (technique, financière et temporelle).</p> <p>Le CEN Bourgogne suit le projet Loire Itinérances et veille à ce que la valorisation touristique de la Loire n'impact pas les espèces et les Habitats d'Intérêt communautaire du site Natura 2000.</p>	3	2.5	Nombre de projets ou d'actions de gestion complémentaires : <b>2</b>	<p>Suivi de l'évolution du projet de contrat territorial et utilisation les études produites pour alimenter l'actualisation du DOCOB.</p> <p>Suivi du projet Loire Itinérances et des interactions sur le site Natura 2000.</p>



## 5.2. Mesures agro-environnementales et climatiques

Action prévue	Description	Jours prévus	Jours réalisés	Indicateurs de résultats	Suites à donner
Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC)	<p>L'animation agricole a été nécessaire dans le cadre de la prolongation des MAEC en 2021, avec pour tâches effectuées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rédaction d'un PAEC 2021 pour la reconduction des MAEC à échéance.</li> <li>- Contact des 35 exploitants signataires, rédaction et signature de pré-engagements MAEC</li> <li>- Mise à jour de diagnostics écologiques</li> <li>- Assistance à la déclaration PAC</li> </ul>	75	71	Taux de réengagement des agriculteurs : <b>95,4%</b>	<p>Maintien de la dynamique de contractualisation.</p> <p>Recrutement de nouveaux exploitants pour la prochaine PAC</p>
Bilan et évaluation globale	Pour permettre de réaliser un bilan quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre des mesures agro-environnementales et climatiques en prenant en compte les engagements des agriculteurs en 2020, une prolongation de l'opération jusqu'à fin septembre 2020 a été proposée et validée par le maître d'ouvrage.	18	18	<p>Nombre d'exploitants : <b>35</b></p> <p>Surfaces contractualisées : <b>3 000 ha</b></p> <p>Mesures de conversion de culture : <b>+14%</b></p>	Les résultats du rapport montrent que le maintien d'une agriculture extensive est indispensable pour conserver les prairies et les pelouses ligériennes en bon état de conservation.

### 5.3. Contrats et Chartes Natura 2000

Action prévue	Description	Jours prévus	Jours réalisés	Indicateurs de résultats	Suites à donner
Contrat Natura 2000	<p>A St Ouen-sur-Loire, lieu-dit Le Port des Bois, le Contrat N2000 porté par un propriétaire privé, n'a pu être réalisé à l'automne 2020 (indisponibilité de l'entrepreneur). Pour faciliter le suivi des populations de nymphoïdes peltata, les zones colonisées ont été relevées au GPS.</p> <p>A Luthenay-Uxeloup, l'animation Natura 2000 a travaillé à l'émergence d'un contrat Natura 2000 sur un massif forestier privé (analyse des enjeux, rencontre sur site et proposition d'actions). L'opération visait la création de mares forestières et la restauration d'une boire de la Loire.</p>	10	12.5	Nombre de contrats en cours de montage : 2	<p>A St Ouen-sur-Loire, suivi des travaux à l'automne 2021 si l'hydrologie est favorable (assec nécessaire).</p> <p>A Luthenay-Uxeloup relance l'opérateur privé en 2022 pour connaître les raisons de l'arrêt du projet. Financement participatif plutôt que Contrat Natura 2000 ?</p>

## 6. Évaluation et amélioration du dispositif

Action prévue	Description	Jours prévus	Jours réalisés	Indicateurs de résultats	Suites à donner
Bilan et actualisation du DOCOB	Avec la modification du périmètre du site Natura 2000, il a été nécessaire de faire un 1 <sup>er</sup> travail de compilation des données issues des 2 sites ; de vérifier l'obsolescence de certaines données, de certaines mesures (contrats Natura 2000) de vérifier l'évolution des enjeux (changement climatique) et des objectifs.	0	15	Rapport : <b>en cours</b>	Poursuite de l'actualisation du DOCOB en 2022
Suivi du site Natura 2000	La rédaction du rapport annuel d'activité fait le point sur les actions menées et sur la mise en œuvre des mesures du DOCOB. L'analyse peut également permettre de réajuster l'animation pour optimiser la mise en œuvre des mesures.	2	3	Rapport d'activité annuel : <b>1</b>	Rédaction d'un rapport d'activité pour la prochaine tranche d'animation 2010-2021.
Etudes complémentaires : Suivi annuel des Gomphes de Loire	2019 correspondait à la deuxième année consécutive de suivi des gomphes de Loire. Très peu d'exuvies des espèces emblématiques du val de Loire ont été retrouvés, sans explication scientifique. Pour infirmer ou confirmer ces résultats, un troisième passage a débuté au printemps 2021.	0	3.5	Rapport d'étude : <b>0</b>	Poursuite des suivis à l'été 2021 et production des résultats du suivi courant 2022.

## 7. Gestion administrative et financière

Action prévue	Description	Jours prévus	Jours réalisés	Indicateurs de résultats	Suites à donner
Organisation du Copil	En raison de la crise sanitaire et du décalage induit des actions programmées, le COPIL n'a pas été réuni	1.5	0	Nombre de participants au comité de pilotage : <b>0</b> Nombre de structures représentées : <b>0</b>	Le prochain comité de pilotage intégrera les collectivités nivernaises situées en amont de Decize.
Suivi de la conduite de l'animation	Le bilan annuel d'activité est rédigé pour la période d'animation 2020-2021, il reprend les temps réalisés pour chacune des missions.  Le temps réalisé intègre également la rédaction du bilan triennal 2018-2021, incluant la mise en œuvre du DOCOB au cours des 3 dernières années	4	6	Nombre de rapports rédigés : <b>2</b>	Remplissage du bilan sous SIN2.
Relation avec les services de l'État	Des échanges réguliers ont eu lieu avec les services de l'État, maître d'ouvrage de l'animation, pour permettre l'articulation des actions de l'animation Natura 2000  Ces réunions, couplées aux échanges téléphoniques réguliers, ont permis de réaliser des points d'avancement des actions mises en œuvre.	4	4	Nombre de participation à des réunions avec les services de l'État : <b>non chiffré</b>	Poursuite du partenariat avec les services de l'État, notamment dans le cadre de l'actualisation du document d'objectifs.





Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfet de la Nièvre

## Val de Loire nivernais

Zone spéciale de conservation (ZSC) FR2600966

Zone de protection spéciale (ZPS) FR2612010

Carte du périmètre transmis au ministère en charge de l'écologie

